

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PU-002644/17
číslo smlouvy dodavatele: 37029

na realizaci zakázky
„17026 - I/57 KRNOV, ČÁST PETRŮV DŮL“
(č. stavby: 17 026)

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Michaela Slezáková,
Bc. Pavel Hučík, Ing. Marian Ištvanech
pavel.hucik@rsd.cz

e-mail:

tel:

596 663 472; 725 582 040

(dále jen „objednatel“)

a

2. SILNICE.CZ s.r.o.

se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČO, DIČ:

267 92 711, CZ26792711

bankovní spojení:

ČS a.s., Ostrava, č.ú. 3435712/0800

zastoupen:

Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických:

Václav Čotek, výrobní ředitel

554 611 511, mob. 702 167 040

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 17026 - I/57 Krnov, část Petrův Důl, ISPROFIN/ISPROFOND500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 079 292,92 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
17026 - I/57 Krnov, část Petrův Důl	3 079 292,92	646 651,51	3 725 944,43

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 17026 - I/57 Krnov, část Petrův Důl, číslo veřejné zakázky 16PU-002644.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo
- Oznámení o výběru dodavatele
- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- Technická specifikace⁴
- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - Závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

²Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvypředložit na elektronickém datovém nosiči.

³Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.


Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 3 - 10 - 2017

Datum:

PODEPSÁN



Jméno: Ing. Tomáš Opěla

Funkce: ředitel správy Ostrava

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN



Jméno: Ing. Tomáš Vítek, MBA


Funkce: jednatel

za dodavatele/zhotovitele

SILNICE.CZ s.r.o.



SILNICE.CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 KRNOV
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 54300/475/17

Číslo zakázky: 16PU-002644

ISPROFIN / ISPROFOND: 5001110007

Vyřizuje: Vlasta Sobková

SILNICE.CZ s.r.o.
Červený dvůr 918/7
794 01 KRNOV

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„I7026 – I/57 Krnov, část Petrův Důl“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SILNICE.CZ s.r.o.
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČ: 26792711

O d ť v o d ň ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Ostravě dne 19-09-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: 17026 - I/57 Krnov, část Petrův Důl

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Doba pro dokončení	1.1.9	14 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	14 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Ing. Tomáš Opěla
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Nepoužije se
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	48 měsíců pro komunikace (asfaltové

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		souvrství), 36 měsíců pro VDZ plast a 12 měsíců VDZ barva, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 8.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 1.604 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 1.600 Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 3.200 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatel podle Pod-článku 9.1. 320Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 13. 9. 2017



SILNICE.CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Vitek, MBA, jednatel

SILNICE.CZ s.r.o.

Číslo účtu 918/7

Adresa KANCEL

Číslo účtu 918/7

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.


Změnový list (součást Přílohy)			
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS /číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?, 2, 3, 4 a 5	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!!!](dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplněte]			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek		Paré č. 1 2 3 4	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize [doplněte dle potřeby]
Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplněte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Jedná se o škody po zimě (síťové trhliny, výtluky, ztráta asfaltového tmele, mozaikové trhliny) na silnici I/57 v Krnově, km 30,535 – 30,980 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace během zimního období a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP.

Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, sanací podkladní asfaltové vrstvy směr Opava (odfrézováním v tl. 80 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,60 kg/m², pokládkou asf. betonu ACP 22 S v tl. 80 mm), nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,60 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,30 kg/m² a pokládkou asf. betonu ACO 11 S mod v tl. 40 mm. Celková výměra nepřesáhne 3 600 m². Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ (plast-nehlučná a barva-hladká).

Napojení na stávající živici bude provedeno s patřičným ošetřením spáry.

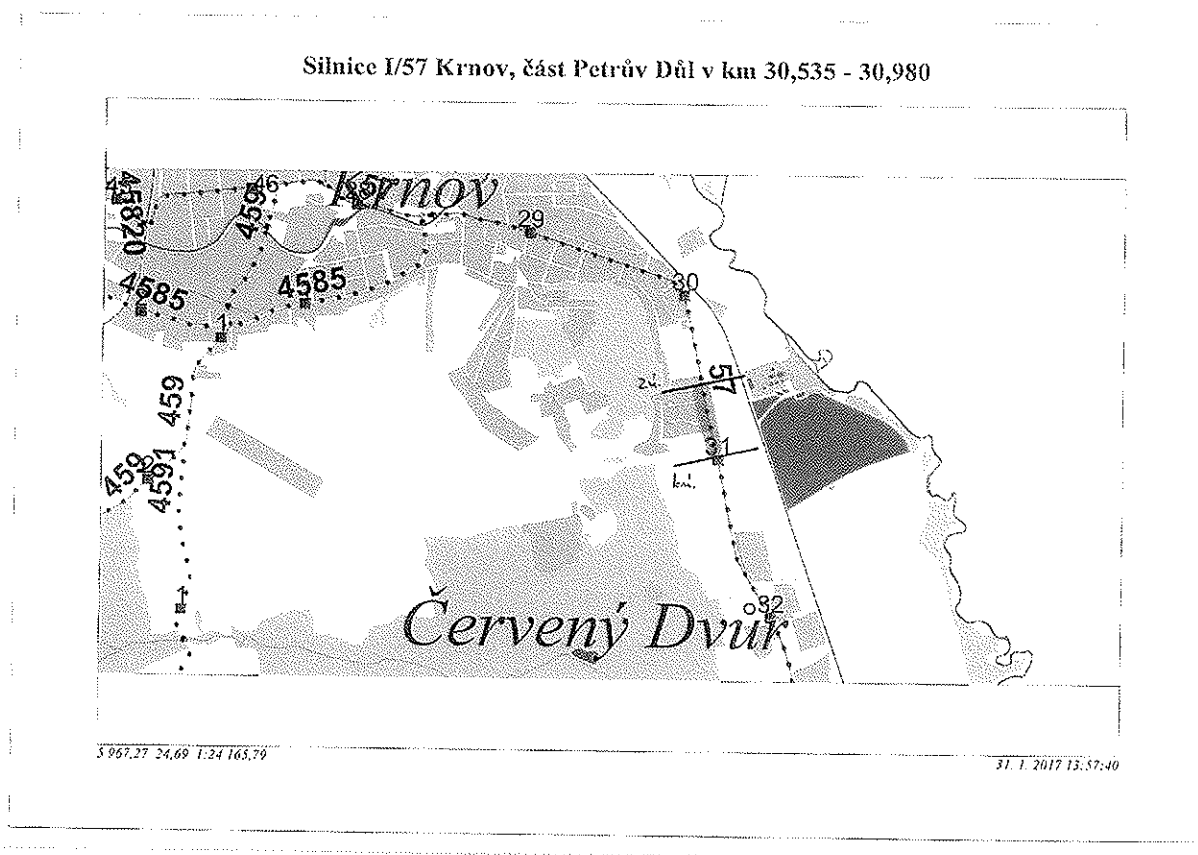

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost SILNICE.CZ s.r.o.

se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČO: 267 92 711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25437,

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 17026 - I/57 Krnov, část Petrův Důl, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
vytěžená frézovaná asfaltová směs	1 066,21 t	117 Kč bez DPH

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Krnově dne 13. 9. 2017



SILNICE.CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel

SILNICE.CZ s.r.o.

Červený dvůr 918/7

794 01 KRNOV

IČO: 267 92 711, DIČ: CZ26792711
